

Razão Social

CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA

Rua da Conceição, nº 154, Sala 907, Centro – Niterói - RJ - CEP: 24.020-084

CNPJ: 20.048.488/0001-34



- PLANO DE SEGURANÇA DO TRABALHO -

ÍNDICE

1. OBJETIVO.....	3
2. REFERÊNCIAS	3
3. COMPROMISSO DA CONSTRUPERJ COM UMA GESTÃO DE SEGURANÇA EFICIENTE	3
4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	4
5. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – NR 06.....	5
6. TAXA DE FREQUENCIA DE ACIDENTES PESSOAIS (CAF E SAF).....	6
7. FERRAMENTAS E OU PROGRAMAS DE SEGURANÇA ADOTADOS.....	6
9. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	11
10. MOBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	12
11. PROGRAMA DE CONTROLE E USO DE ÁLCOOL.....	15
12. PLANO DE EMERGÊNCIA	17
13. SUBCONTRATAÇÃO	22

RAZÃO SOCIAL	CONSTRUPERJ CONSTRUTORA LTDA
ENDEREÇO:	Rua da Conceição, 154, Sala 907, Centro, Niterói – RJ
CNPJ:	20.048.488/0001-34
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	ISENTO
ÁREA GEOGRÁFICA	(-22.894581, -43.119898)
CNAE:	42.21-9-02
ATIVIDADE PRINCIPAL:	Construção de estações e redes de energia elétrica
GRAU DE RISCO:	03
HORÁRIO FUNCIONAMENTO:	2ª a 5ª feira de 7h às 17h e 6ª feira de 7h às 16h
NÚMERO DE COLABORADORES:	61 Empregados [57 Masculino 04 Feminino 00 Deficientes 00 Menor]
CONTATO PREPOSTO:	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO FERROVIÁRIA GIV - OFICINA EGP'S P1-7 E NO PÁTIO CARLOS NEWLANDS (FSN)

1. OBJETIVO

Este plano tem por objetivo estabelecer a dinâmica de medição e monitoramento de meio ambiente, saúde e segurança ocupacional.

2. REFERÊNCIAS

- NBR ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001
- Compliance

3. COMPROMISSO DA CONSTRUPERJ COM UMA GESTÃO DE SEGURANÇA EFICIENTE

Em nossa jornada pela prevenção de acidentes, a equipe Construperj estabeleceu uma gestão de segurança eficiente e proativa. Possuímos uma equipe dedicada exclusivamente à Gestão de Segurança, que trabalha sempre na busca de novas soluções para minimizar riscos em nossas obras. Por meio de **diretrizes inovadoras**, programas de **prevenção**, monitoramento e análise de riscos, e a implantação do programa de prevenção de riscos ambientais, reforçamos nosso compromisso com a preservação da vida, saúde e meio ambiente.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

4.1 ORDEM DE SERVIÇO

O objetivo é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras – NR relativas a segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em segurança e saúde no trabalho – SST.

4.2 SESMT – NR 04

A implantação do SESMT depende da gradação do risco da atividade principal da empresa (CNAE) e do número total de empregados do estabelecimento. A Construperj Construtora não se enquadra no dimensionamento do número total de empregados. No entanto mantém um Engenheiro de Segurança do trabalho e **Técnicos de Segurança do Trabalho** em seu quadro de funcionários.

4.3 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR

Este programa tem como objetivo centralizar as ações de prevenção e gerenciamento de riscos, tornando as práticas mais dinâmicas e eficazes, portanto é o conjunto de procedimentos, técnicas de gestão, métodos de avaliação, registros e controles de monitoramento e avaliação de riscos que devem ser seguidos e adotados pela Construperj com o objetivo de prevenção de acidentes de trabalho, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção. O programa contempla no mínimo o inventário de riscos e o plano de ação. Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais são consolidados em um inventário de riscos ocupacionais. O Inventário de Riscos Ocupacionais são contemplados, no mínimo, as seguintes informações:

- caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
- caracterização das atividades;
- descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;
- dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17;
- e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação;
- f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.

Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.

6. TAXA DE FREQUENCIA DE ACIDENTES PESSOAIS (CAF E SAF)

INDICADORES DE SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL ÚLTIMO 3 ANOS				Ano em Curso
INDICADORES	2020	2021	2022	2023
TFSA (Taxa de Frequência Sem afastamento)	0	0	147,58	49,41
TFCA (Taxa de Frequência Com Afastamento)	0	0	274,62	105,71
TG (taxa de Gravidade)	0	0	1324,73	1585,62
Número de Acidentes Fatais (últimos 10 anos)	0	0	0	0
Número de Acidentes Críticos - envolvem mutilação, e/ou perda de sentidos e/ou invalidez permanente (últimos 10 anos)	0	0	0	0
Número de autuação de órgãos (federais, estaduais, municipal) em relação as questões de segurança do trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente	0	0	0	0
Número de Doenças Ocupacionais	0	0	0	0
Número de Empregados	40	55	93	60
Número de Horas Homens trabalhada	10560	145200	163060,33	143000
Total de acidente com afastamento (CAF)	0	0	4	1
Total de Acidente Sem afastamento (SAF)	0	0	1	1

TFSA / TFCA – últimos 3 anos

7. FERRAMENTAS E OU PROGRAMAS DE SEGURANÇA ADOTADOS

7.1 REGRAS DE OURO

As regras de ouro tem o objetivo de prevenir acidentes do trabalho e reforçar os comportamentos de segurança dos colaboradores.

Na operação da Construperj, as **5 regras de ouro** são:



8.2. DDS

Promovemos um ambiente de trabalho seguro com comunicação aberta e constante sobre questões de segurança. Por isso realizamos em todo início de jornada Diário Diários de Segurança (DDS), reunindo nossas equipes para compartilhar boas práticas, tirar dúvidas e alinhar procedimentos de prevenção.

AGOSTO 2023						
Domingo	Segunda-feira	terça-feira	quarta-feira	quinta-feira	sexta-feira	sábado
Inspeção de Ferramenta / Cor do mês –AMARELO	DDS	DDS Direito de Recusa	DDS Importância da APR	DDS Utilização do corrimão com segurança em escadas	DDS Comunicação de Riscos	DDS Tema Livre
6 DDS Tema Livre	7 DDS Regras de Ouro	8 DDS Notificação dos Desvios	9 DDS Direito de Recusa	10 DDS Análise Preliminar de Risco	11 DDS Uso do Telefone na via	12 DDS Tema Livre
13 DDS Tema Livre	14 DDS Direito de Recusa	15 DDS Importância da APR	16 DDS Regras de Ouro	17 DDS Preenchimento Obrigatório do Checklist	18 DDS Regulamento Operacional	19 DDS Tema Livre
20 DDS Tema Livre	21 DDS Cuidados com Cabos de Circuito Alta Tensão Avariado em Plataforma e na Linha Férrea	22 DDS Análise Preliminar de Risco	23 DDS Regra de Ouro	24 DDS EQUIPE	25 DDS Direito de Recusa	26 DDS Tema Livre
27 DDS Tema Livre	28 DDS Movimentação de Materiais na Via	29 DDS Importância da APR	30 DDS Direito de Recusa	31 DDS Movimentação de Materiais na Via	PROGRAMA-SEI	

Agenda mensal DDS

- DDS - Diálogo Diário de Segurança

Tema: Equipamentos de Proteção Individual

Para exercer as atividades diárias no trabalho, não basta estar atento e ser dedicado. É preciso utilizar o equipamento de proteção individual (EPI) indicado para a função.

Além de prevenir acidentes, os EPIs contribuem para evitar lesões e doenças ocupacionais. Mais do que cumprimento de uma norma, o EPI é a garantia de qualidade de vida no desempenho de suas atribuições. O equipamento de proteção individual é um dispositivo ou produto de uso individual destinado à proteção de riscos. Normatizados pela Norma Regulamentadora – NR-06, os EPIs variam conforme a função e a atividade a ser desempenhada pelo trabalhador. Eles devem ser fornecidos gratuitamente pela empresa e substituídos sempre que necessário. À empresa cabe ainda fornecer orientação sobre sua utilização e exigir dos funcionários seu uso durante a jornada de trabalho. Ao funcionário cabe a utilização correta do equipamento, o cuidado e manutenção do equipamento de proteção, além do pedido de substituição quando houver desgaste ou qualquer outro problema.

Todos os equipamentos de proteção individual devem ter o Certificado de Aprovação (CA), do órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego. Há diversos tipos de EPIs, cada um indicado a um tipo de atividade, conforme os riscos a que o trabalhador esteja exposto e a parte do corpo a ser protegida. Portanto para as nossas atividades temos os seguintes Equipamentos de proteção Individual obrigatórios:

Capacete com queixo, Calçado de segurança, Óculos de proteção, Luva de segurança, Perneira, Cinto e talabarte para atividades em altura



- DDS - Diálogo Diário de Segurança

Tema: Trabalho em Altura

Sempre que trabalharmos em uma altura igual ou maior que dois metros, será considerado trabalho em altura. O trabalho em altura inclui trabalhos realizados em plataformas portáteis e móveis, escadas, andaimes e qualquer lugar a partir do qual objetos possam cair e causar ferimentos em alguém.

As quedas de altura são um dos principais incidentes no trabalho. E elas são causadas sempre pelos seguintes fatores:

- Falta de planejamento e avaliação de risco do trabalho;
- Não utilização de um cinto de segurança;
- Uso de cinto de segurança danificado;
- Utilização de cinto de segurança de maneira incorreta;
- Uso de cinto de segurança sem fixar o mosquetão ou trava-quedas em um ponto de ancoragem;
- Prender o cinto em um ponto de ancoragem errado;
- Plataformas de trabalho instáveis e que podem cair;
- Degeneração das plataformas elevadas;
- Buracos, vãos, escavações e passagens não isoladas corretamente ou desprotegidos.

É importante observarmos que também existem requisitos para pessoas envolvidas num trabalho em altura.

- Todas as pessoas que vão trabalhar em altura devem ter treinamento para realizar o trabalho.
- As pessoas que têm histórico de tonturas, desmaios, problemas cardíacos, labirintite, vertigem e epilepsia devem procurar o departamento médico para uma avaliação de aptidão médica para trabalho em altura.

Na avaliação de riscos, vamos sempre observar:


- O risco de queda de objetos e de pessoas;
- Seleção de medidas de controle apropriadas usando a hierarquia de controles;
- A possibilidade de vento, chuva, neve, poeira, gases, iluminação precária e temperatura;
- Seleção de equipamentos apropriados;
- Seleção de pontos de ancoragem e amarração;
- Condições de estruturas de suporte, como telhados;
- Seleção de barricada e/ou demarcação apropriada;
- Isolamento e sinalização da área abaixo.



Temas de DDS relacionados aos agendamentos e atividade crítica




DDS em grupos de trabalhos ministrado por liderança

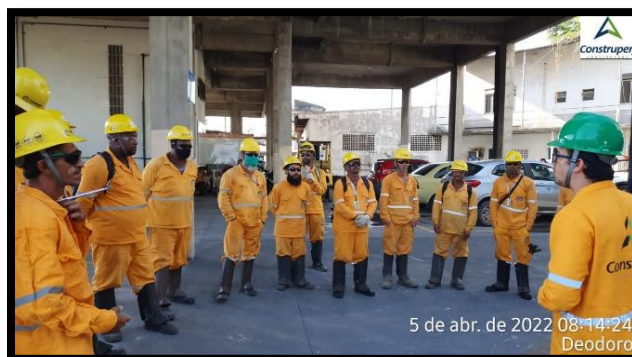

DDS ministrado para todas as equipes

8.3. CAMPANHAS DE SEGURANÇA

Acreditamos no poder da informação para transformar comportamentos. Realizamos campanhas mensais de conscientização em todas as nossas obras. Essas campanhas abordaram temas essenciais de **segurança**, reforçando nosso compromisso com o **cuidado** e bem-estar de cada colaborador.

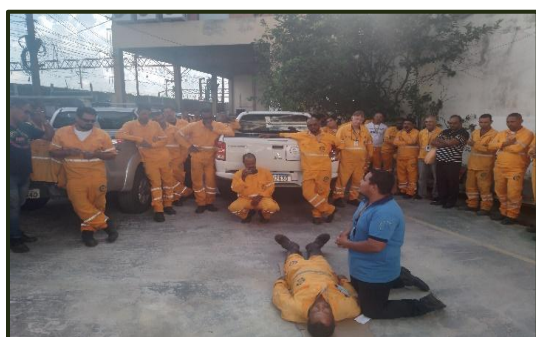

Campanhas de segurança

8.4. REUNIÕES COM LIDERANÇA



8.5. RECONHECIMENTO POR COMUNICAÇÃO DOS RISCOS



8.6. PROJETO ANJO DA GUARDA



8.7. METODOLOGIAS DE INSPEÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

Inspecionamos ferramentas, máquinas e equipamentos antes do início do projeto e a partir daí mensalmente pelo encarregado / Segurança do trabalho com relação aos itens de saúde e segurança conforme lista de verificação da Cor do Mês apropriado.



Inspeção cor do mês



Sinalização de Segurança em via pública



Inspeções de Máquinas e equipamentos

9. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

A Construperj mantém seus colaboradores aptos a realizar o trabalho em altura e com eletricidade.

Temos um planejamento de matriz dos treinamentos para todos os colaboradores, atendendo a periodicidade, necessidade e conhecimento, com carga horária de formação e reciclagem para cada atividade, risco e área.

	LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE TREINAMENTOS															
	Ordem de Serviço (NR 01)	CIPA (NR 05)	Equipamento de Proteção Individual (NR 06)	Serviços de Eletricidade (NR 10 - Básico)	Serviços de Eletricidade (NR 10 - SEP)	Transporte, Movimentação e Armazenagem (NR 11)	Proteção de Máquinas e Equipamentos (NR 12)	Integração de Segurança no Trabalho (NR 18)	Treinamento de Espaço Confinado (NR 33)	Trabalho em Altura (NR 35)	Trabalho a Quente	Direção Defensiva	Movimentação de Carga	Guia de Movimentação de Carga	Percepção de Risco	Treinamento de Plano de Emergência
Validade do certificado (meses)	12	12	12	24	24	12	12	12	12	24	12	12	12	12	12	12
Carga horária (horas)	1	16	2	40	40	16	16	8	16	8	6	6	6	6	6	6
Reciclagem	1	16	2	20	20	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6
Modalidade	Sala de Aula	Sala de Aula	Sala de Aula	Sala de Aula	Sala de Aula	Sala de Aula	Sala de Aula	Sala de Aula	Sala de Aula	Sala de Aula	Sala de Aula	Sala de Aula	Sala de Aula	Sala de Aula	Sala de Aula	Sala de Aula
Disponibilidade	Recurso Interno	Recurso Interno	Recurso Interno	Recurso Interno	Recurso Interno	Recurso Interno	Recurso Interno	Recurso Interno	Recurso Interno	Recurso Interno	Recurso Interno	Recurso Interno	Recurso Interno	Recurso Interno	Recurso Interno	Recurso Interno
Gestão	SST	SST	SST	SST	SST	SST	SST	SST	SST	SST	SST	FROTA	SST	SST	SST	SST
Funções	ANALISTA DE FROTAS	Mandatório	N/A	Mandatório	Opcional	N/A	N/A	N/A	Mandatório	N/A	Opcional	N/A	N/A	N/A	Mandatório	Mandatório
	ANALISTA DE QUALIDADE	Mandatório	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatório	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatório
	ANALISTA DE RH	Mandatório	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatório	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatório
	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I / II / III / IV	Mandatório	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatório	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatório
	ASSISTENTE FINANCEIRO I / II / III / IV	Mandatório	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatório	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatório
	AUXILIAR COMERCIAL	Mandatório	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatório	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatório
	AUXILIAR DE CIVIL	Mandatório	N/A	Mandatório	Mandatório	Opcional	N/A	N/A	Mandatório	N/A	Mandatório	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Mandatório
	AUXILIAR DE REDE	Mandatório	N/A	Mandatório	Mandatório	Opcional	N/A	N/A	Mandatório	N/A	Mandatório	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Mandatório
	AUXILIAR TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	Mandatório	N/A	Mandatório	Mandatório	Opcional	N/A	N/A	Mandatório	N/A	Mandatório	N/A	N/A	N/A	Mandatório	Mandatório
	COORDENADOR ADMINISTRATIVO I	Mandatório	N/A	Mandatório	Mandatório	Opcional	N/A	N/A	Mandatório	N/A	Mandatório	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatório
	COORDENADOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Mandatório	N/A	Mandatório	Mandatório	Opcional	N/A	N/A	Mandatório	N/A	Mandatório	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatório
	ENCARREGADO I / II	Mandatório	N/A	Mandatório	Mandatório	Opcional	N/A	N/A	Mandatório	N/A	Mandatório	N/A	N/A	N/A	Recomendado	Mandatório
	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Mandatório	N/A	Mandatório	Mandatório	Opcional	N/A	N/A	Mandatório	N/A	Mandatório	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatório
	GERENTE DE CONTRATO	Mandatório	N/A	Mandatório	Mandatório	Opcional	N/A	N/A	Mandatório	N/A	Mandatório	N/A	N/A	N/A	N/A	Mandatório
	MOTORISTA DE CAMINHÃO I / II / III / IV	Mandatório	N/A	Mandatório	Mandatório	Opcional	N/A	Recomendado	Mandatório	N/A	Mandatório	N/A	Mandatório	Mandatório	Recomendado	Mandatório
	OFICIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA I / II / III / IV	Mandatório	N/A	Mandatório	Mandatório	Mandatório	N/A	Recomendado	Mandatório	N/A	Mandatório	N/A	N/A	N/A	Mandatório	Mandatório

Matriz de Treinamentos

9.1 EXIGÊNCIAS DOS TREINAMENTOS POR EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Treinamentos	Sim	Não
Ordem de Serviço	X	
NR 06 – Equipamento de Proteção Individual	X	
NR 10 – Básico de Eletricidade	X	
NR 10 - SEP		X
NR 11 – Movimentação de Cargas		X
NR 12 – Máquinas e Equipamentos		X
NR 18 - Integração	X	
NR 35 – Trabalho em Altura	X	

10. MOBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS


10.1 CONFIGURAÇÃO DO CANTEIRO

A princípio as atividades serão realizadas nas instalações do cliente.

10.2 CONFIGURAÇÃO DA ÁREA DE VIVÊNCIA



10.3 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

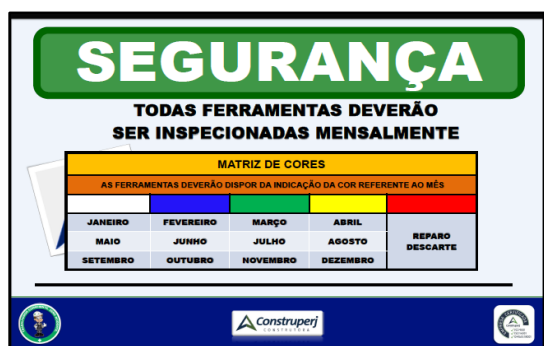

10.4 RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA

NOME DO EQUIPAMENTO	BASTÃO DE MANOBRA
	CONSISTE DE UM GANCHO ARTICULÁVEL E RETRÁTIL EM SUA EXTREMIDADE, OPERÁVEL POR UMA MANOPLA REGULÁVEL EM SUA REGIÃO DE EMPUNHADURA EM TRÊS POSIÇÕES BÁSICAS DE TRABALHO, ATRAVÉS DE UMA CREMALHEIRA E DUAS TRAVAS DE SEGURANÇA, PARA TORNAR A FERRAMENTA PRÁTICA DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES. CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO (TRAÇÃO) DE 133 DAN, TENSÃO MÁXIMA DE USO DE 138KV. DEVE POSSUIR BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO.
NOME DO EQUIPAMENTO	ESCADA EXTENSÍVEL
	ESCADA EXTENSÍVEL EM FIBRA DE VIDRO, MONTANTE PERFIL U, DEGRAUS EM LIGA DE ALUMÍNIO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE CIRCULAR OU EM "D" ARREBITADO, CINTA DE APOIO EM NÁILON TRANÇADO E REVESTIDO EM NEOPRENE EMBORRACHADO, CATRACA EM ALUMÍNIO, CORDA DE POLIESTER, ROLDANA DE IÇAMENTO NO PARTE SUPERIOR, SAPATAS FIXAS DE BORRACHA SINTÉTICA
NOME DO EQUIPAMENTO	ESCADA SIMPLES
	ESCADA SIMPLES EM FIBRA DE VIDRO, MONTANTE PERFIL U, DEGRAUS EM LIGA DE ALUMÍNIO COM FRISOS ANTIDERRAPANTE CIRCULAR OU EM "D" ARREBITADO, CINTA DE APOIO EM NÁILON TRANÇADO E REVESTIDO EM NEOPRENE EMBORRACHADO, SAPATAS FIXAS DE BORRACHA SINTÉTICA.
NOME DO EQUIPAMENTO	ANDAIME ISOLADO
	AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS IEC-60855 E ASTM F 711 PARA QUE SEJA PERMITIDO O USO EM INSTALAÇÕES ENERGIZADAS EM ATÉ 800 KV, COM TOTAL GARANTIA DE ISOLAMENTO ELÉTRICO E UMA CAPACIDADE NOMINAL DE TRABALHO ATÉ 300 DAN (660 LB) NO CENTRO DA PLATAFORMA. CONTER SISTEMA DE TRAVAMENTO ENTRE OS COMPONENTES DO ANDAIME. OS MÓDULOS DEVEM POSSUIR DEGRAUS COM TRATAMENTO ANTIDERRAPANTE E TRAVAMENTO E PLATAFORMA CONSTITUÍDA DE FIBRA DE VIDRO. CORDA COM FORMAÇÃO DE MULTIFILAMENTOS DE POLIPROPILENO, DE COR BRANCA, TORCIDAS EM TRÊS PERNAS EM ROLOS DE 220 M, Ø 1/2" E SEPARADOR ISOLANTES PARA CORDA.

NOME DO EQUIPAMENTO	CONE DE SINALIZAÇÃO
	CONE EM PVC MALEÁVEL E RESISTENTES A ABRASÃO, IMPACTOS E ATROPELAMENTOS POR VEÍCULOS, FABRICADO EM PEÇA ÚNICA (SEM EMENDAS), NA COR LARANJA COM 2 OU 3 FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS EM MICROESFERA/GOLAS REFLETIVAS, TAMANHO 750X400MM, PESO 4KG. OS CONES NÃO DEVEM SE DESLOCAR OU TOMBAR QUANDO SUJEITOS À CORRENTES DE AR PROVOCADAS PELA PASSAGEM DE VEÍCULOS A UMA DISTÂNCIA DE APROXIMADAMENTE 1M E A UMA VELOCIDADE DE 80 KM/H.
NOME DO EQUIPAMENTO	BANDEIROLA PARA SINALIZAÇÃO
	BANDEIROLA DE SINALIZAÇÃO TREVIRA FLUORESCENTE LARANJA, FABRICADA EM TECIDO DE POLIÉSTER REVESTIDO EM PVC, ILHOS NA PARTE SUPERIOR COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO DURÁVEIS E RESISTENTES. DIMENSÕES: 300 MM X 400 MM. NÃO DEVE POSSUIR LOGO OU INFORMAÇÕES DO FABRICANTE.

11. PROGRAMA DE CONTROLE E USO DE ÁLCOOL

A Construperj realiza teste qualitativo com etilômetro para determinar a concentração de álcool no sangue.

Modalidade	Execução	Frequência
Aleatório	Adm e Operacional	Diariamente
Pré-funcional	Todos os colaboradores e contratados que exerçam atividades: Motorista, operador de máquina, condutor de máquina	Diariamente
Motivado	Contratado específico para liderança	Quando solicitado
Pós-acidente	Pessoas envolvidas em incidentes	Quando da ocorrência de Incidentes
Acompanhamento	Colaborador em tratamento de reabilitação	Testes realizados entre 30 a 60 dias dias de intervalo



11.1 Tratamento

A Construperj, não tem histórico de tratamento ou casos apresentados.

A política da empresa em casos identificados, seja por encaminhamento da equipe SST, por pedido voluntário de ajuda ou por solicitação da família poderá, conforme cada caso, orientar e encaminhar para tratamento especializado.

O tratamento dos casos identificados são disponibilizado nos seguintes termos:

Quando confidencialmente for avaliado pela equipe medicina do trabalho

Colaborador é informado sobre o Programa de Atenção e Prevenção dos problemas relacionados ao Álcool e outras Drogas (PRAD) e motivado a nele participar.

Acompanhamento periódico pela equipe da medicina do trabalho.

Quando for por pedido voluntário:

Internação em regime de hospital-dia ou internado em Instituições Públicas Especializadas

Participação no pós-tratamento em instituições especializada pelo período determinado pela mesma;

Quando por solicitação da família:


Sensibilização do indivíduo para aceitação do diagnóstico e do decorrente tratamento;

Estabelecimento das opções terapêuticas, porém inicialmente dar-se-á preferência ao tratamento ambulatorial.

A importância do apoio familiar é primordial para a recuperação, neste momento. Procurar integrar a família e o funcionário no Programa.

12. PLANO DE EMERGÊNCIA

12.1 Fluxograma de acionamento

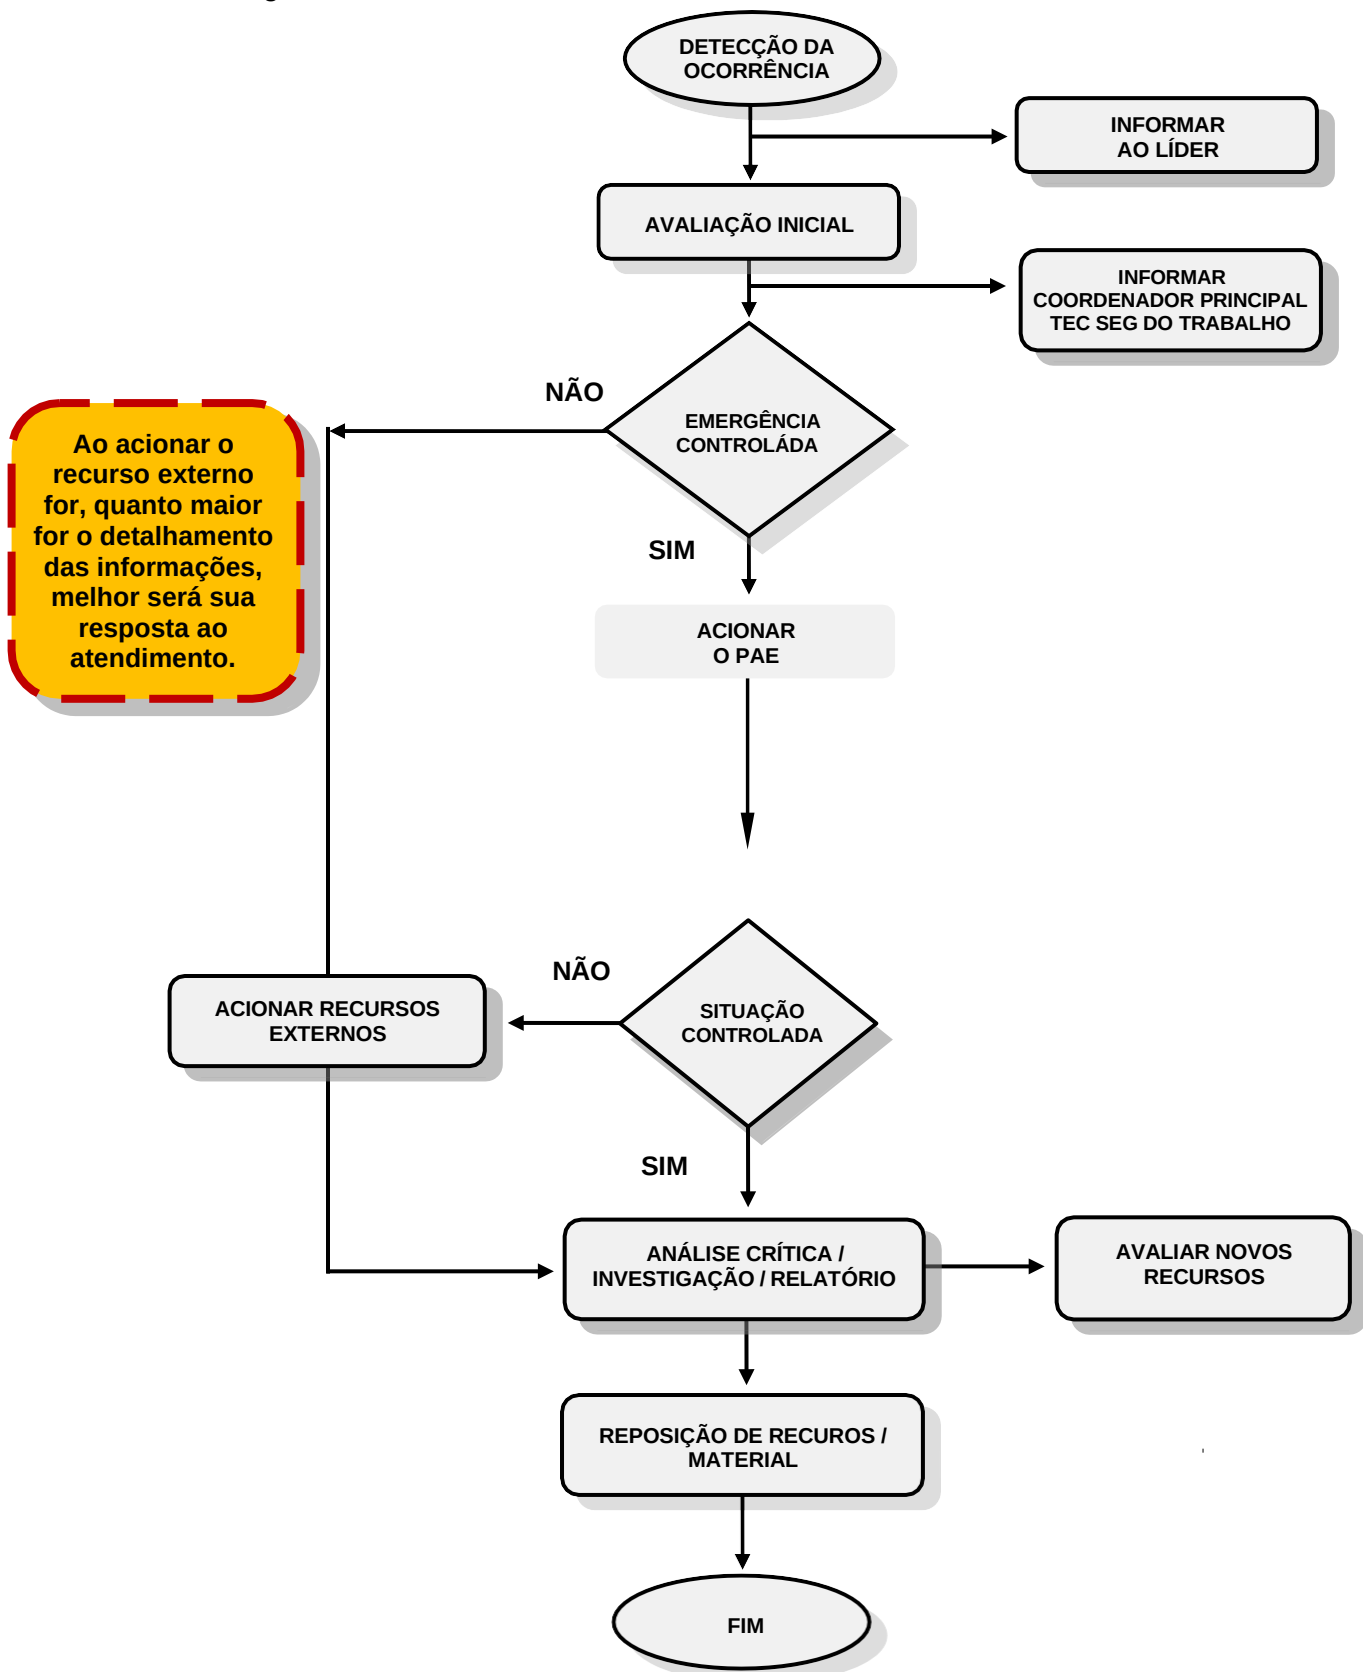

12.1 Relação de locais estratégicos e contatos de assessoria (hospitais, empresa ou equipe especializada para atendimento de emergência).

NOME	TELEFONE
Coordenador do PAE Kleiton Espinheira	(21) 97315-2600
Técnico em Segurança do Trabalho Wisley Conceição	(21) 99052-4855
Supervisão Operacional Rafael Palhano	(21) 99338-3790
Supervisão Operacional Rennan Bastos	(21) 99056-7691

REGIÃO	HOSPITAL / UPA	CONTATO
DUQUE DE CAXIAS	Hospital Municipal Adão Pereira Nunes Rodovia Washington Luiz, 109 – BR-040, s/nº Jardim Primavera – Duque de Caxias	(21) 2777-6353
SARACURUNA		
MAGÉ	UPA 24H Saracuruna Avenida Presidente Roosevelt – Parque Uruguaiana, Duque de Caxias	(21) 2678-8345
BELFORD ROXO	Hospital Municipal de Belfor Roxo Avenida Retiro da Imprensa, 1013, Vila Medeiros, Belford Roxo	
RICARDO DE ALBUQUERQUE	UPA 24H Ricardo de Albuquerque Estr. Mal. Alencastro, s/n - Ricardo de Albuquerque, Rio de Janeiro	(21) 2333-5727
ANCHIETA		
OLINDA	Hospital Municipal Juscelino Kubitschek Rua Zezinho, 111 - Centro, Nilópolis	(21) 3762-9182
NILOPOLIS		
EDSON PASSOS	UPA 24h Mesquita Av. Pres. Costa e Silva, S/N - Edson Passos, Mesquita	(21) 2796-9950
MESQUITA	UPA 24h Mesquita Av. Pres. Costa e Silva, S/N - Edson Passos, Mesquita	(21) 2796-9950
JUSCELINO		
NOVA IGUAÇU		
COMENDADOR SOARES		
AUSTIN	Hospital Geral de Nova Iguaçu Av. Henrique Duque Estrada Meyer	(21) 3779-9900
QUEIMADOS	Hospital Geral de Nova Iguaçu Av. Henrique Duque Estrada Meyer UPA de Queimados R. Mário Ferreira dos Reis, 218 - Nossa Sra. da Gloria, Queimados	(21) 3779-9900 (21) 2665-6955
ENGENHEIRO PEDREIRA	Unidade Mista de Engenheiro Pedreira Av. Tancredo Neves, 634-716 - Parque Mucaja, Japeri	(21) 2664-2605
JAPERI		

REGIÃO	HOSPITAL / UPA	CONTATO
DUQUE DE CAXIAS	Hospital Municipal Adão Pereira Nunes Rodovia Washington Luiz, 109 – BR-040, s/nº Jardim Primavera – Duque de Caxias	(21) 2777-6353
SARACURUNA		
MAGÉ	UPA 24H Saracuruna Avenida Presidente Roosevelt – Parque Uruguaiana, Duque de Caxias	(21) 2678-8345
BELFORD ROXO	Hospital Municipal de Belfor Roxo Avenida Retiro da Imprensa, 1013, Vila Medeiros, Belford Roxo	
RICARDO DE ALBUQUERQUE	UPA 24H Ricardo de Albuquerque Estr. Mal. Alencastro, s/n - Ricardo de Albuquerque, Rio de Janeiro	(21) 2333-5727
ANCHIETA		
OLINDA	Hospital Municipal Juscelino Kubitschek Rua Zezinho, 111 - Centro, Nilópolis	(21) 3762-9182
NILOPOLIS		
EDSON PASSOS	UPA 24h Mesquita Av. Pres. Costa e Silva, S/N - Edson Passos, Mesquita	(21) 2796-9950
MESQUITA	UPA 24h Mesquita Av. Pres. Costa e Silva, S/N - Edson Passos, Mesquita	(21) 2796-9950
JUSCELINO		
NOVA IGUAÇU		
COMENDADOR SOARES		
AUSTIN	Hospital Geral de Nova Iguaçu Av. Henrique Duque Estrada Meyer	(21) 3779-9900
QUEIMADOS	Hospital Geral de Nova Iguaçu Av. Henrique Duque Estrada Meyer UPA de Queimados R. Mário Ferreira dos Reis, 218 - Nossa Sra. da Glória, Queimados	(21) 3779-9900 (21) 2665-6955
ENGENHEIRO PEDREIRA	Unidade Mista de Engenheiro Pedreira Av. Tancredo Neves, 634-716 - Parque Mucaja, Japeri	(21) 2664-2605
JAPERI		

ENTIDADE	TELEFONES
Corpo de Bombeiros	193
SAMU	192
Defesa Civil	199
Polícia Militar	190

Dados do acidente:		
Data:	Horário:	Local:
Descrição do Acidente:		
Análise das causas (Por que e como ocorreu o acidente?)		

13. SUBCONTRATAÇÃO

O início das atividades realizadas por uma Subcontratada para a Construperj, salvo se pequenos serviços, somente será permitido após a análise e aprovação pelas áreas de SSO, Setor Fiscal e pelo Gestor do Contrato, cumprindo o fluxo:

1. Entrega de documentos pela Subcontratada;
2. Análise e aprovação dos documentos pelo SSO, Setor Fiscal e Gestor do Contrato;
3. Treinamento Integração de Segurança, antes do início das atividades;
4. Arquivamento da documentação.

13.1. Entrega de documentos

Após o processo de seleção da Contratada, o Gerente Comercial solicita a entrega de documentos relacionados a as áreas.

Recebido os documentos, os documentos são encaminhados para o SSO e posteriormente para Setor Fiscal, onde serão conferidos os documentos pertinentes a cada área.

13.2. Análise e aprovação dos documentos

O SSO, Setor Fiscal e o Gerente Comercial analisa criticamente os documentos recebidos, registrando o "OK" em campo específico nas documentações Constatadas anormalidades, estas deverão ser anotadas no campo "Comentários" para posterior envio de cópia à Subcontratada, ficando esta desqualificada, não podendo iniciar serviços até que sejam corrigidas as anormalidades.

13.3. Treinamento Integração de Segurança

Superada a análise documental e a Subcontratada sinalizada como qualificada pelas áreas de SSO, Setor Fiscal e Gerente Comercial, o treinamento integração de segurança deverá ser agendado com a área de SSO para os colaboradores da Subcontratada. Este treinamento deverá acontecer antes do início dos serviços.

13.4. Arquivamento da documentação

A documentação apresentada pela Subcontratada, após a análise e aprovação pelas áreas, deverá ser encaminhada ao SSO em até sete dias úteis para armazenamento, ficando disponível para consultas posteriores.

13.5. Execução dos serviços

Após a qualificação documental e treinamento de integração de segurança, a Subcontratada se encontra apta ao início dos serviços. Antes da realização dos serviços, a Subcontratada deverá elaborar uma análise de preliminar de riscos e Permissão de Trabalho para a atividade, tomando ciência dos critérios de planejamento da tarefa e do potencial necessidade de emissão de PT. Realizar um DSS dando ciência aos colaboradores dos perigos e riscos que possam estar expostos durante a execução da tarefa.

13.6. Auditoria, supervisão e inspeção dos serviços

Durante a execução de serviços, Representante de Segurança, Técnico de Segurança ou qualquer Colaborador poderão inspecionar as tarefas, executadas pelo Subcontratado que julgue apropriado e caso encontrem alguma não conformidade emitirão relatório de não conformidade, podendo solicitar a paralização dos serviços se julgarem a sua continuidade de risco grave e iminente aos colaboradores. A Contratada deverá apresentar plano de ação para as não conformidades evidenciadas, com prazos razoáveis e as respectivas evidências após o seu cumprimento.

13.7. Melhoria Continuada

Deverá a Subcontratada disponibilizar seus colaboradores para eventos promovidos pela Construperj, treinamentos e orientações, com o objetivo de promover a integração entre ambos. Ao final de um contrato, ou antes da renovação deste, o Gestor do Contrato com apoio do SSO e Setor Fiscal deverão proceder a uma análise crítica do Contrato à luz do SSO, fazendo uma avaliação final, como forma de mensurar os objetivos de SSO e sua viabilidade de renovação ou aplicar as melhorias percebidas durante a análise crítica nas novas contratações.

14. RESPONSÁVEL PELO PLANO DE SEGURANÇA DO TRABALHO



Kleiton de Melo Espinheira
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA-RJ: 2014139970
COREN-RJ: 236204

Kleiton de Melo Espinheira
CREA: 2014139970
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Engenheiro Segurança do Trabalho
